



Färdiganmälan - Checklista

Avsändare

Fastighetsbeteckning	Adress:
Namn fastighetsägare	Personnummer
Adress (om ej samma som ovan)	
Postnummer och ort	
Telefon:	Mobiltelefon
Namn behörig elinstallatör	
Mobiltelefon	

Fastighetsinstallation: checkbox fylls i av fastighetsägaren

OBS! Ifylles av huvudman eller dess ombud vid driftsättning

		JA	NEJ	Anmärkning
1. Anläggningen är utförd i enlighet med monteringsanvisningen för LPS2000_____ (t ex frostskydd, förankring och placering).	☐	☐	☐	
2. Vattenledningen inom fastigheten är utförd med 32 mm ledning, PE DN32, tryckklass PN12 (blå märkning).	☐	☐	☐	
3. Tryckavloppsledningen inom fastigheten är utförd med 40 mm ledning, PE DN40, tryckklass PN 8 (brun märkning).	☐	☐	☐	
4. Återfyllning till befintlig marknivå kring tanken är färdig i enlighet anvisningarna i "Montering och drift - LPS2000E2/Ex".	☐	☐	☐	
5. Ledningar inom egen fastighet tål 6 bars tryck.	☐	☐	☐	
6. Vattenmätarkonsol med 2 st ventiler och backventil efter utgående ventil samt passbit är monterad. Konsolen ska vara placerad frostfritt och lättåtkomligt för montage, byte och avläsning. Placeringen skall utföras enligt bifogad monteringsanvisning "Beulco montering 120502 - sida 1 och 2	☐	☐ ☐	☐ ☐	
7. Vatten- och avloppsledningarna är renspolade	☐	☐	☐	

Färdiganmälan och checklista

forts. från föregående sida checkbox ifylles av fastighetsägaren

		Ja	Nej	Anmärkning
8. Marken inom en radie av 1,5 m från LPS-enhetens skall vara utförd i enlighet anvisningarna i "Montering och drift - LPS2000E2/Ex".	☐	☐	☐	
9. Befintligt avloppssystem är överkopplat till LPS-tanken.	☐	☐	☐	
10. Befintligt vattensystem (eget brunnsvatten eller motsvarande) är fränkopplat.	☐	☐	☐	
11. LPS-tanken är urpumpad, torr och rengjord. Detta görs med för del samma dag som huvudmannen installerar pumpen.	☐	☐	☐	
12. Fungerande tappkran (i kök, badrum, källare eller vatten-utkastare) finns för påfyllning av tank vid montering av pumpen.	☐	☐	☐	
13. Första tappstället för vattnet är placerad efter vattenmätaren.	☐	☐	☐	
ELINSTALLATION				
14. Elinstallation är utförd av behörig elinstallatör.	☐	☐	☐	
15. Larmlampa ska vara placerad på synlig plats så att fastighets-ägaren uppmärksammar högnivåalarmet.	☐	☐	☐	
16. Säkerhetsbrytare är installerad och testad.	☐	☐	☐	
17. Elinstallationen ska vara färdig enligt monteringsanvisningen och testad. Pump och larmindikator ska vara inkopplade med separata 10 A, trög säkring. Säkringarna ska vara uppmärkta vid el-centralen.	☐	☐	☐	
OBS. Kontrollera punkt 8-13 samt 17 direkt före installationstillfället.				Kontroll vid driftsättning utförd av
Jag intygar att anläggningen är utförd enligt ovan lämnade uppgifter och enligt Skandinavisk Kommunaltekniks monteringsanvisningar. Jag är införstådd med att jag härmed tar på mig betalningsansvaret för en bom-körningsavgift på 1125 kronor inklusive moms om min VA-anläggning trots denna färdiganmälan inte skulle vara färdig för inkoppling vid överenskom-men tidpunkt. Ny tidpunkt för driftsättning bokas när brister är åtgärdade.				Telefon

Datum och ort

Underskrift Fastighetsägare

Namnförtydligande

Underskrift behörig elektriker samt telefonnummer

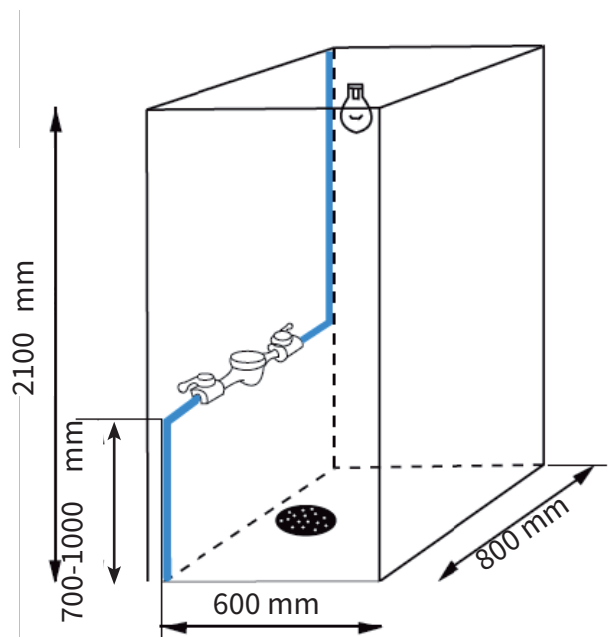


Bild 1. Vattenmätarplacering.

Vattenmätarkonsol placeras lätt åtkomlig för service och kontroll enligt bild
